


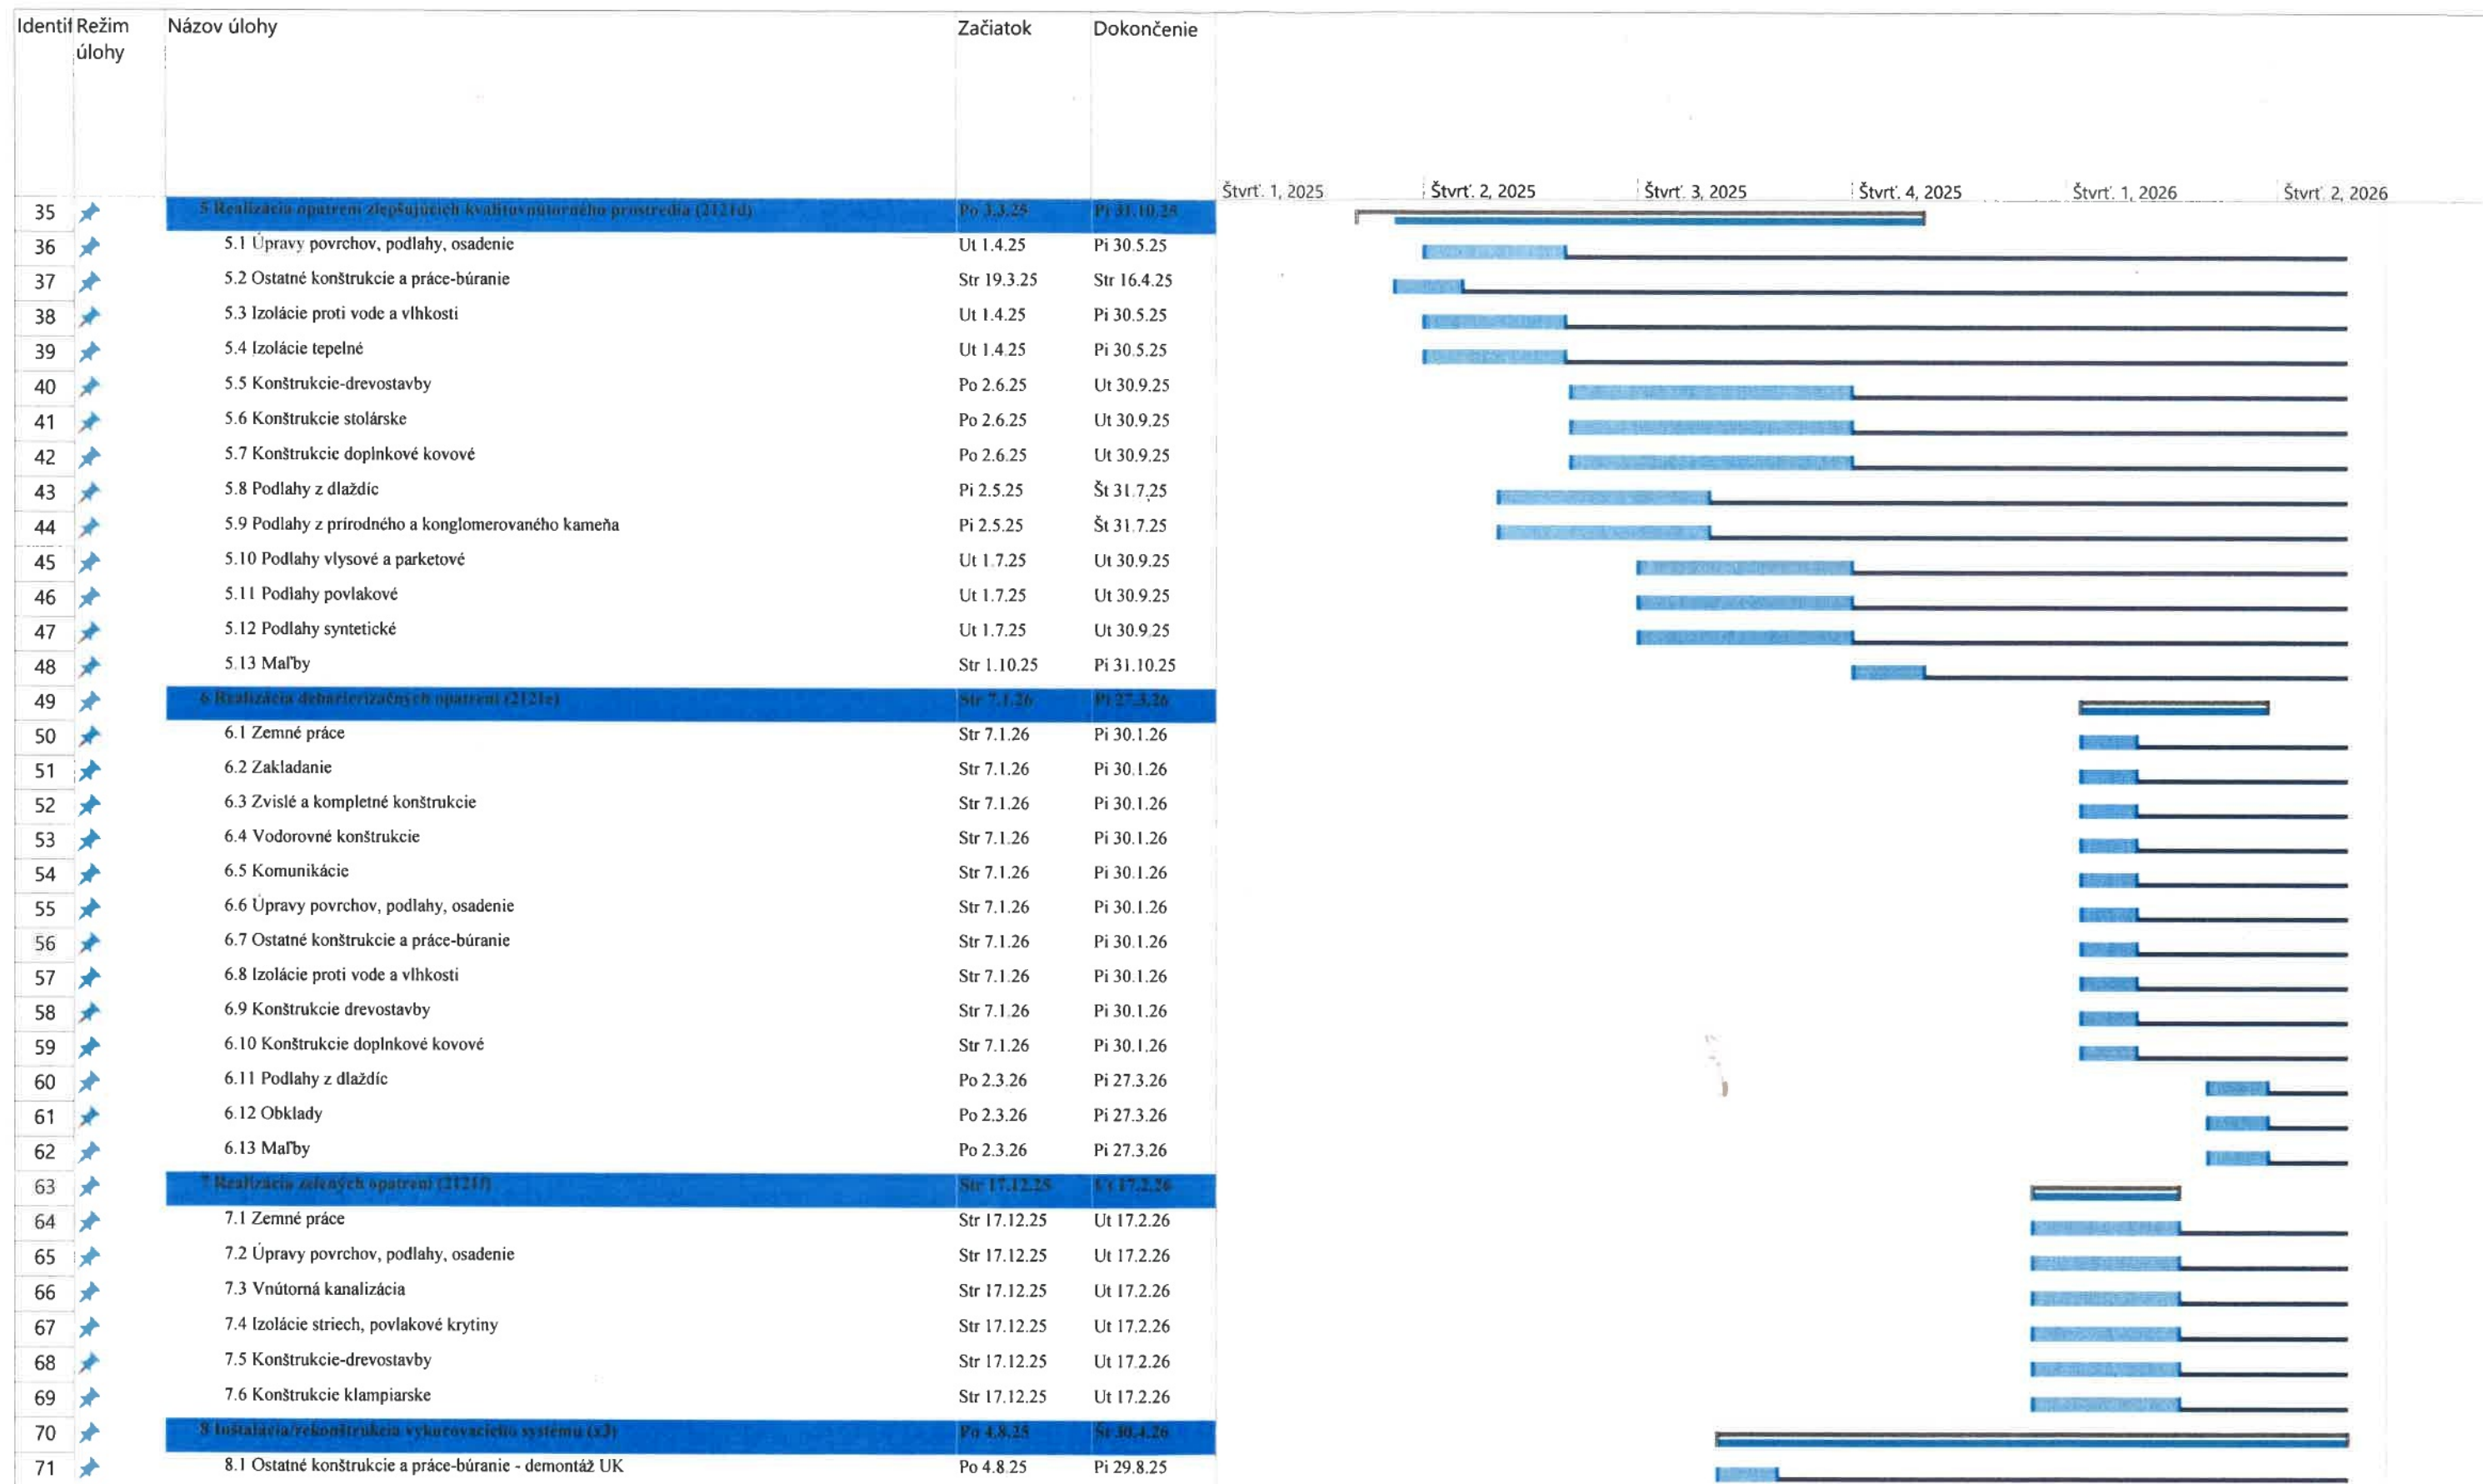

Projekt: Rekonštrukcia obecného
Dátum: Str 12.3.25

Úloha		Súhrn projektu		Manuálna úloha		Iba začiatok		Termín		Priebeh	
Rozdeliť		Neaktívna úloha		Iba trvanie		Iba dokončiť		Kritické		Manuálny priebeh	
Medzník		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Externé úlohy		Kritické rozdelenie		Časová rezerva	
Súhrn		Neaktívny súhrn		Manuálny súhrn		Externý medzník		Oneskorenie			

Identif.	Režim úlohy	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie	Štvrť. 1, 2025	Štvrť. 2, 2025	Štvrť. 3, 2025	Štvrť. 4, 2025	Štvrť. 1, 2026	Štvrť. 2, 2026
72	★	8.2 Ostatné konštrukcie a práce-búranie - nové rozvody, montáž UK	Str 11.2.26	Ut 31.3.26						
73	★	8.3 Ostatné konštrukcie a práce-búranie - montáž radiátorov, tlakové skúšky	Str 1.4.26	Str 29.4.26						
74	★	8.4 Izolácie tepelné - odstránenie tepelnej izolácie	Po 4.8.25	Pi 29.8.25						
75	★	8.5 Izolácie tepelné- izolácia potrubí	Po 1.9.25	Št 16.10.25						
76	★	8.6 Izolácie tepelné - protipožiarne prestupy	Po 2.3.26	Ut 31.3.26						
77	★	8.7 Ústredné kúrenie-kotolne - demontáž kotlov	Po 4.8.25	Pi 29.8.25						
78	★	8.8 Ústredné kúrenie-kotolne - montáž kotlov regulácie	Po 2.3.26	Ut 31.3.26						
79	★	8.9 Ústredné kúrenie-kotolne - uvedenie kotlov do prevádzky	Št 2.4.26	Str 15.4.26						
80	★	8.10 Ústredné kúrenie -strojovne - demontáž	Po 4.8.25	Pi 29.8.25						
81	★	8.11 Ústredné kúrenie-strojovne - montáž expanznej nádoby, technológie	Po 2.3.26	Ut 31.3.26						
82	★	8.12 Ústredné kúrenie-strojovne - uvedenie do prevádzky	Str 1.4.26	Str 29.4.26						
83	★	8.13 Ústredné kúrenie-rozvodné potrubie z uhlíkovej ocele -montáž	Str 4.3.26	Ut 31.3.26						
84	★	8.14 Ústredné kúrenie-rozvodné potrubie z uhlíkovej ocele - tlaková skúška	Ut 7.4.26	Št 23.4.26						
85	★	8.15 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie - demontáž potrubí	Po 4.8.25	Pi 29.8.25						
86	★	8.16 Ústredné kúrenie -armatúry - demontáž	Po 4.8.25	Pi 29.8.25						
87	★	8.17 Ústredné kúrenie -armatúry -montáž	Št 12.2.26	Ut 31.3.26						
88	★	8.18 Ústredné kúrenie-armatúry - tlakomer	Po 6.4.26	Pi 10.4.26						
89	★	8.19 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá - demontáž	Po 4.8.25	Pi 29.8.25						
90	★	8.20 Ústredné kúrenie -vykurovacie telesá -montáž	Po 2.3.26	Pi 27.3.26						
91	★	8.21 Ústredné kúrenie -vykurovacie telesá - tlaková skúška	Št 16.4.26	Str 29.4.26						
92	★	8.22 Konštrukcie doplnkové kovové - demontáž	Po 4.8.25	Pi 29.8.25						
93	★	9 Inštalácia/rekonštrukcia systémov chladenia a vetrania (4x)	Str 1.10.25	Str 30.4.26						
94	★	9.1 Zariadenie č.1 - Vetranie spoločenskej sály a Svadobnej sály - montáž	Str 1.10.25	Pi 28.11.25						
95	★	9.2 Zariadenie č.1 - Vetranie spoločenskej sály a Svadobnej sály - zaregulovanie, vyskúšanie, odovzdanie zariadení	Str 1.4.26	Št 16.4.26						
96	★	9.3 ZTI - vnútorná kanalizácia - montáž	Str 1.10.25	Pi 28.11.25						
97	★	9.4 ZTI - vnútorná kanalizácia - vyskúšanie, odovzdanie	Str 1.4.26	Pi 17.4.26						
98	★	9.5 Zariadenie č.4 - Vetranie suterénu - montáž	Str 1.10.25	Pi 28.11.25						
99	★	9.6 Zariadenie č.4 - Vetranie suterénu - vyskúšanie, odovzdanie	Str 1.4.26	Pi 17.4.26						
100	★	9.7 Zariadenie č.5 - Demontáž jestvujúcich ventilátorov, Likvidácia	Str 1.10.25	Pi 28.11.25						
101	★	9.8 Zariadenie č.5 -Montáž potrubných ventilátorov - vyskúšanie	Str 1.4.26	Pi 17.4.26						
102	★	9.9 Zakladanie	Str 1.10.25	Pi 28.11.25						
103	★	9.10 Zvislé a kompletne konštrukcie valcované nosníky	Str 1.10.25	Pi 28.11.25						
104	★	9.11 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Str 1.10.25	Pi 28.11.25						
105	★	9.12 Konštrukcie doplnkové kovové - montáž oceľovej konštrukcie pre VZT	Str 1.10.25	Pi 28.11.25						
106	★	9.13 Konštrukcie doplnkové kovové - náter	Str 1.4.26	Pi 17.4.26						
107	★	10 Inštalácia/rekonštrukcia prípravy teplej vody (5x)	Po 6.4.26	Pi 10.4.26						
108	★	11 Rekonštrukcia/modernizácia osvetlenia (x6)	Po 2.3.26	Ut 31.3.26						

Projekt: Rekonštrukcia obecných Dátum: Str 12.3.25	Úloha		Súhrn projektu		Manuálna úloha		Iba začiatok		Termín		Priebeh	
	Rozdeliť		Neaktívna úloha		Iba trvanie		Iba dokončiť		Kritické		Manuálny priebeh	
	Medzník		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Externé úlohy		Kritické rozdelenie		Časová rezerva	
	Súhrn		Neaktívny súhrn		Manuálny súhrn		Externý medzník		Oneskorenie			

Identif	Režim úlohy	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie						
					Štvrť. 1, 2025	Štvrť. 2, 2025	Štvrť. 3, 2025	Štvrť. 4, 2025	Štvrť. 1, 2026	Štvrť. 2, 2026
109		12 Inštalácia zariadení využívajúcich OZE (02)	Pr 12.36	€121.3.26						

Projekt: Rekonštrukcia obecnéh Dátum: Str 12.3.25	Úloha		Súhrn projektu		Manuálna úloha		Iba začiatok		Termín		Priebeh	
	Rozdeliť		Neaktívna úloha		Iba trvanie		Iba dokončiť		Kritické		Manuálny priebeh	
	Medzník		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Externé úlohy		Kritické rozdelenie		Časová rezerva	
	Súhrn		Neaktívny súhrn		Manuálny súhrn		Externý medzník		Oneskorenie			

Príloha č. 8 - Zoznam osôb, splnomocnených objednávateľom

p.č.	meno, priezvisko, titul	funkcia na projekte	rozsah zmocnenia
1.		manažér projektu	
2.		technický dozor	
3.		iní pracovníci	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Vysvetlenie k tabuľke

Tabuľka bude upresnená a doplnená na základe výsledkov výberových konaní zadávateľa

p.č.	meno, priezvisko, titul	funkcia na projekte	rozsah zmocnenia
1.	Ernest Németh	Starosta obce	- Podpisovanie zmlúv, dodatkov k zmluvám a k PD, - Podpisovanie zmenových listov, - podpisovanie faktúr, - odovzdanie staveniska, - preberanie dokončenej stavby, - vydávanie záväzných pokynov, - účasť na kontrolných dňoch, - realizovanie zápisov do stavebného denníka, - kontrola vykonávaných a vykonaných prác, - vykonávanie právomocí štatutára v zmysle Zmluvy o dielo
2.	Norbert Hudák Ing.	Prednosta obce	- Podpisovanie zmenových listov, - odovzdanie staveniska, - preberanie dokončenej stavby, - účasť na kontrolných dňoch, - realizovanie zápisov do stavebného denníka, - konzultácie technických záležitostí na projekte, - kontrola vykonávaných a vykonaných prác, - vykonávanie právomocí v zmysle Zmluvy o dielo
3.	Iveta Fajnorová Mgr.	Referent investičnej výstavby	- Odovzdanie staveniska, - preberanie dokončenej stavby, - účasť na kontrolných dňoch, - realizovanie zápisov do stavebného denníka (len spolu so stavebným dozorom), - konzultácie technických záležitostí na projekte, - kontrola vykonávaných a vykonaných prác,
4.	Lucia Šindlerová Ing.	Referent investičnej výstavby	- Odovzdanie staveniska, - preberanie dokončenej stavby, - účasť na kontrolných dňoch, - realizovanie zápisov do stavebného denníka, (len spolu so stavebným dozorom) - konzultácie technických záležitostí na projekte, - kontrola vykonávaných a vykonaných prác,
5.	Ivan Medžo MUDr.	Stavebný dozor	- Odovzdanie staveniska, - preberanie dokončenej stavby, - účasť na kontrolných dňoch, - realizovanie zápisov do stavebného denníka, - konzultácie technických záležitostí na projekte, - kontrola vykonávaných a vykonaných prác, - vykonávanie právomocí stavebného, resp. technického dozora v zmysle právnych predpisov, Zmluvy o dielo a Zmluvy na výkon stavebného dozora

			- Kontrolovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy, technických noriem a dojednané ustanovenia v zmysle zmluvy o dielo, - viesť evidenciu dochádzky na stavbe, - vykonávať kontrolnú obhliadku staveniska, stavby a prác, ktoré majú byť zakryté. Počas každej obhliadky je oprávnený a povinný obhliadnuť tie časti staveniska, na ktorých aktuálne prebiehajú stavebné práce,
6.	Eva Cocherová Mgr.	Projektový manažér	- účasť na kontrolných dňoch, - informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho pokynov, - skontrolovať úplnosť predložených podkladov a upozorniť objednávateľa a zhotoviteľa na zistené nedostatky týchto podkladov alebo ich nekompletnosť,
7.	Martin Krajčí Ing.arch.	Hlavný projektant	- Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. - Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. - Počas každej obhliadky je oprávnený a povinný obhliadnuť tie časti staveniska, na ktorých aktuálne prebiehajú stavebné práce, - vykonávať kontrolnú obhliadku staveniska, stavby a prác, ktoré majú byť zakryté. - odovzdanie staveniska, - preberanie dokončenej stavby, - účasť na kontrolných dňoch, - realizovanie zápisov do stavebného denníka,
8.			
9.			
10.			

PRÍLOHA č. 13 Zoznam projektovej dokumentácie podľa zoznamu dokumentácie

OU DL Exped. úprava (2x ZIP):
Architektonicko-stavebná časť
Statika
Protipožiarna bezpečnosť stavby
Elektroinštalácia, Prípojka NN
Prípojka NN
Plynoinštalácia
Vykurovanie
Vzduchotechnika, chladenie
Zdravotechnika
Projekt organizácie výstavby
Projektové energetické hodnotenie
Energetický certifikát

OU DL Debarierizácia

PD OU DL Fotovoltika
